


Contractul de lucrări Nr. RSP/W12/01-02: Rehabilitation of R34 Hîncești - Leova - Cahul - Giurgiulești; Lot 1 : km 0+000 - km 42+200, Lot 2 : km 42+200 - km 83+000.						
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	30.07.19		Harta cu sectoarele în lucru			
Finantare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Loan Agreement N° 45094 dated 28 June 2013					
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	83,0 km					
Antreprenor Contractor	OZKA Insaat A.S. (Turkey) Diriginte de santier S. CHIPERI +37379023200					
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer	IRD Engineering S.R.L (Italy) in association with ICT Intecontinental Consultants and Technocrats Pvt. Ltd (India) Responsabil tehnic I.VIERU +37369051500					
Data semnării contractului Date of signing the contract	21.02.20					
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	24.08.20					
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works days	915					
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0					
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	25.02.23					
Timp utilizat (%) Time used (%)	176%		Lucrari raportate în ultimele 2 săptămâni Works reported in the last 2 weeks			
Valoarea de Contract Acceptată (Euro) Accepted Contract Value (EUR)	56 495 268.42 EUR		Finisarea și nivelarea taluzului : km 0+630 - km 1+280 dr. Construcția trotuarului: km 65+675 - km 67+347 dr.,			
Valoarea achitată până în prezent (Euro) Accepted Contract Value (EUR)	45 493 076.47 EUR		Probleme depistate Problems occurred			
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	80.53%		1. Management defectuos a procesului de construcție cit si a întretinerii lucrarilor efectuate. 2. Capacitatea portantă în patul drumului este mai mică decât cea prevăzută în proiect. Suntem în căutarea unei soluții. 3. Executarea lucrărilor în tempou foarte lent. 4. Exproprierea terenurilor. 5. Insuficiența personalului calificat (echipe pentru poduri, podețe și terasamente). 6. Precipitațiile abundente din data de 14.09.- 15.09.2024. Cele mai afectate secțiunile sunt de la km 39 la km 47, km 51, km 53, km 58 și de la km 69 la km 70. Așteptăm de la antreprenor program de remediere a daunelor. 7. Antreprenor are restante de salariu către angajați timp de trei luni din luna august pînă la moment			
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	60.74%					
Data ultimei ședințe cu Antreprenorul și Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	11.11.24					
PROGRES FIZIC ULTIMELE 3 LUNI		Săptămîna 1 0.00	Săptămîna 2 0.02	Săptămîna 3 0.00%	Săptămîna 4 0.14%	
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.1 Interim Payment Certificate (IPC) No.1(avans 1)	Suma in Euro	Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data)	Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data)	Emis spre receptionare MIDR	Achitarea CIP (data)	Total zile pentru achitare CIP
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.29 Interim Payment Certificate (IPC) No.29	777 327.68	14.03.2024	02.04.2024	10.04.2024	19.04.2024	36
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.30 Interim Payment Certificate (IPC) No.30	609 968.09	12.04.2024	03.05.2024	14.05.2024	22.05.2024	40
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.31 Interim Payment Certificate (IPC) No.31	1 120 621.07	27.05.2024	21.06.2024	28.06.2024	08.07.2024	42
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.32 Interim Payment Certificate (IPC) No.32	1 160 423.89	24.06.2024	19.07.2024	22.07.2024	01.08.2024	38
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.33 Interim Payment Certificate (IPC) No.33	1 415 525.75	22.07.2024	02.08.2024	06.08.2024	16.08.2024	25
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.34 Interim Payment Certificate (IPC) No.34	980 185.92	20.08.2024	10.09.2024	13.09.2024	26.09.2024	37
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.35 Interim Payment Certificate (IPC) No.35 1 541 152.58 Euro	88 285.24	01.10.2024	Nu sa procesat			
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.36 Interim Payment Certificate (IPC) No.36	-98 022.31	31.10.2024	Nu sa procesat			
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.37 Interim Payment Certificate (IPC) No.37	1 815 274.28	27.12.2024				
Ordin de Variatie (OV) Nr.	Denumirea O.V	Valoarea	Demersul Antreprenorului catre Inginer	Aprobarea VO (data, demersul)		
Variation Order (VO)						

Programme of Works No.05

	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Planned Progress	61.34%	62.4%	63.46%	63.81%	64.06%	64.31%	64.72%	66.15%	69.29%	73.04%	77.23%	81.12%	84.88%	88.38%	89.27%	89.34%
Actual Progress	59.80%	60.36%	60.57%	60.58%	60.74%											
Monthly Progress	1.03%	-0.56%	0.21%	0.00%	-0.02%											
Time Elapsed	164%	167%	170%	174%	177%	180%	184%	187%	190%	194%	197%	200%	204%	207%	210%	214%

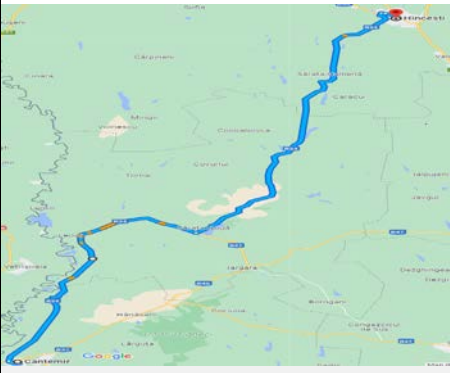
