


Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/01: Construction of M3 Chişinău - Comrat - Giurguleşti - Romanian border, sector Vulcăneşti border, km 0+000 - km 8+580.

Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	27.04.2018					
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094					
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	8,58 km					
Antreprenor Contractor	Automagistral-Pivden LLC (Ukraine) Diriginte de santier A. BACINSCHI +37368698762					
Inginer (Compania de Supraveziere) Engineer	EPTISA Servicios de Ingenieria, S.L. (Spania) in association with EPTISA Romania S.R.L. R. PERCIUN +37360726363					
Data semnării contractului Date of signing the contract	13.06.2023					
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	15.08.2023					
Durata de execuție a lucrărilor (luni) Period of the works (months)	915					
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0					
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	15.02.2026					
Temp utilizat (%) Time used (%)	-4935%	Lucrari raportate				
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	21 291 226.31 EUR	<ul style="list-style-type: none"> • Execuția stratului drenant la pasaj km 4+690; • Consolidarea intersecției minore km 2+900 - km 3+100; • Amenajarea iluminatului stradal km 2+600 - km 3+100 				
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	10 966 939.38 EUR	Probleme depistate:				
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	51.51%	<ul style="list-style-type: none"> • Exproprierea terenului din zona Moldsilva 				
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	55.88%					
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	21.11.2024					
PROGRES FIZIC ULTIMELE 3 LUNI (%)						
	Sapt 1	Sapt 2	Sapt 3	Sapt 4	Sapt 5	
	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.03%	
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.5 Interim Payment Certificate (IPC) No. 5	741 232.10	MD/RSPW14/AB/290	MD/W3 Vulcanesti/01/10/0 5/313 din 24.06.2024	24.06.2024	08.07.2024	14
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.6 Interim Payment Certificate (IPC) No. 6	1 416 593.51	MD/RSPW14/AB/349	MD/W3 Vulcanesti/01/10/0 5/386 din 24.06.2024	03.09.2024	10.10.2024	37
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.7 Interim Payment Certificate (IPC) No. 7	626 433.59	MD/RSPW14/AB/372	MD/W3 Vulcanesti/01/10/0 5/428 din 24.06.2024	18.10.2024	28-Oct-24	10
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.8 Interim Payment Certificate (IPC) No. 8	1 119 867.44	MD/RSPW14/AB/391	MD/W3 Vulcanesti/01/10/0 5/443 din 24.06.2024	06.11.2024	21-Nov-24	15
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr.9 Interim Payment Certificate (IPC) No. 9	581 899.09	MD/RSPW14/AB/413	MD/W3 Vulcanesti/01/10/0 5/474 din 24.06.2024	10.12.2024	18-Dec-24	8
Certificatul Interimar de de plată (CIP) Nr. 10 Interim Payment Certificate (IPC) No. 10	561 059.99	MD/RSPW14/AB/440	MD/W3 Vulcanesti/01/10/0 5/494 din 20.12.2024	03.01.2025		
Nr. Ordinului de Variatie (OV)	Denumirea O.V	Valoarea	Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data)	Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)		
OV Nr.1 draft	Revised BoD based on additional works due to project modifications	443 189.05 EUR	MD/RSPW14/AB/303	11-09/4539 din 10.09.2024		
OV Nr.2 draft						

Programme of Works No. 025 dated 11.09.2023

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Planned Progress	7%	9%	11%	13%	18%	26%	30%	32%	35%	38%	40%	42%
Actual Progress	4.89%	6.90%	8.89%	12.28%	16.82%	20.08%	28.26%	38.40%	46.70%	51.60%	54.05%	54.84%
Monthly Progress	1.59%	2.20%	2.03%	3.74%	4.54%	3.26%	8.18%	10.14%	8.30%	4.90%	2.45%	0.79%
Time Elapsed	18%	22%	25%	28%	32%	35%	38%	42%	45%	48%	52%	55%

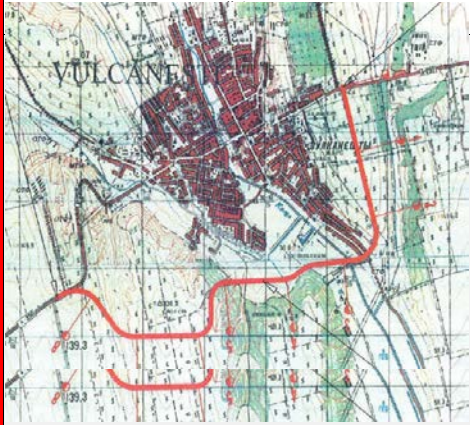
