



Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/02: Rehabilitation R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – Ukraine border, section km 92+620 – km 123+620.						
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	22.12.2022					
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094					
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	31.00					
Antreprenor Contractor	ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Turkey) Diriginte de santier T. JALBA +37369211166					
Inginer (Compania de Supraveziere) Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy) Responsabil tehnic P.DUBNEAC +37367106551					
Data semnării contractului Date of signing the contract	11.07.2023					
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	01.12.2023					
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days)	915					
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0					
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	03.06.2026					
Temp utilizat (luni) Time used (%)	45.79%					
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	34 639 831.46 EUR					
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	14 617 081.83 EUR					
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	42.20%					
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	20.53%					
Data ultimei sedințe cu Antreprenorul și Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	05.06.2024					
PROGRES FIZIC ULTIMELE 3 LUNI (%)						
	Săptămâna 1 0.00%					
	Săptămâna 2 0.00%					
	Săptămâna 3 0.00%					
	Săptămâna 4 0.00%					
	Săptămâna 5 0.00%					
Nr. Certificatului interimar de plată	Valoarea CIP (lei)	Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data)	Demersul Inginerului catre ASD (Nr., Data)	Emis spre receptionare MIDR	Achitarea CIP (data)	Total zile pentru aprobarea CIP (inclusiv achitarea)
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.1	3 463 983.14 EUR	28-Jul-23	8-Aug-23	11-Aug-23	24-Aug-23	27
Certificatul Interimar de plată (IPC) Nr.2	3 463 983.15 EUR	5-Oct-23	6-Oct-23	12-Oct-23	24-Oct-23	19
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.3	597 819.43 EUR	4-Jun-24	19-Jun-27	1-Jul-24	10-Jul-24	36
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.4	604 893.96 EUR	16-Aug-24	26-Aug-24	3-Sep-24	10-Oct-24	55
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.5	1 095 355.35 EUR	29-Aug-24	1-Oct-24	4-Oct-24	16-Oct-24	48
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.6	1 464 759.42 EUR	8-Oct-24	24-Oct-24	28-Oct-24	7-Nov-24	30
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.7	1 504 188.15 EUR	5-Nov-24	28-Nov-24	4-Dec-24	16-Dec-24	41
Certificatul Interimar de plată (CIP) Nr.8	2 422 099.23 EUR	29-Nov-24	4-Dec-24	5-Dec-24	20-Dec-24	21
Nr. Ordinului de Variatie (OV)	Denumirea O.V	Valoarea	Demersul Antreprenorului catre Inginer (Nr., Data)	Aprobarea VO (data, demersul) Approval (date and letter)		

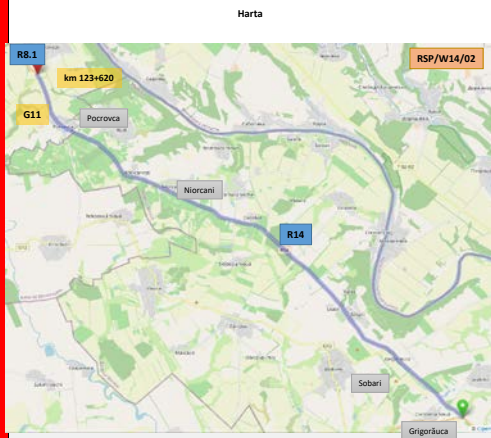

Programme of Works No. 01

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Planned Progress	38%	39%	41%	46%	52%	57%	63%	73%	82%	90%	91%	92%
Actual Progress	20.53%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Monthly Progress	0.00%	0.00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Time Elapsed	47%	50%	53%	56%	60%	63%	66%	70%	73%	77%	80%	83%

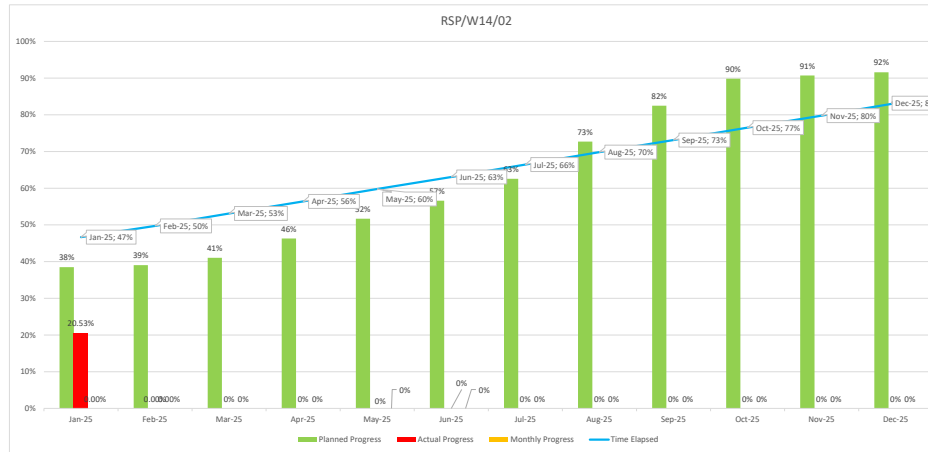

	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Planned Progress	2%	2%	3%	7%	12%	18%	24%	29%	34%	36%	38%	38%
Actual Progress	0%	0%	0%	0%	0.71%	1.90%	4.12%	7.68%	11.36%	15.87%	18.65%	20.53%
Monthly Progress	0%	0%	0%	0%	0.71%	1.19%	2.22%	3.56%	3.68%	4.51%	2.78%	1.88%
Time Elapsed	7%	10%	13%	17%	20%	23%	27%	30%	33%	37%	40%	43%
