


16.05.2025		
Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/02: Rehabilitati		
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	22.12.2022	
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094	
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	31.00	
Antreprenor Contractor	ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey)	
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy)	
Data semnării contractului Date of signing the contract	11.07.2023	
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	01.12.2023	
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days)	915	
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0	
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	03.06.2026	
Timp utilizat (luni) Time used (%)	45.79%	Lucrari majore raportate in ultima săptămână:
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	34 639 831.46 EUR	
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	14 617 081.83 EUR	
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	42.20%	
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	20.53%	
Data ultimei sedințe cu Antreprenorul și Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	05.06.2024	
		Nu s-au efectuat lucrari in perioada raportata

Programme of Works No. 01

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Planned Progress	38%	39%	41%	46%	52%	57%	63%	73%	82%	90%	91%	92%
Actual Progress	20.53%	20.66%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Monthly Progress	0.00%	0.13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Time Elapsed	47%	50%	53%	56%	60%	63%	66%	70%	73%	77%	80%	83%

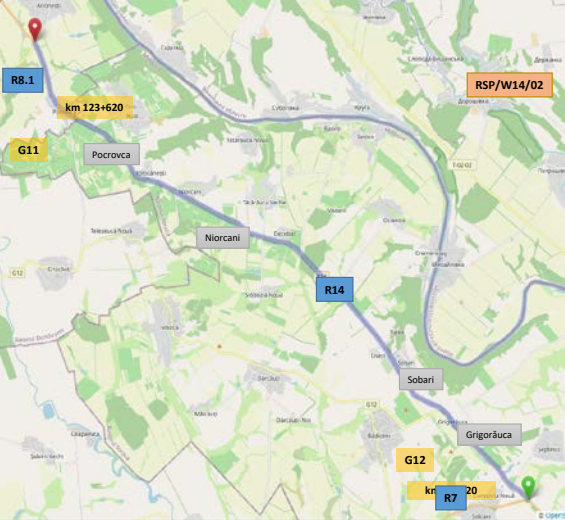
