


16.05.2025

Contractul de lucrări Nr. RSP/W15/01: Rehabilitation R33 Hîncești - Lăpușna - M1, km 0+000 - km 37+200	
Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)	03.07.2023
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094
Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)	37,2
Antreprenor Contractor	ONUR Taahhut Tasimaçlik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey)
Înginer (Compania de Supervizare) Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy)
Data semnării contractului Date of signing the contract	12.12.2023
Înștiințarea de începere a lucrărilor Commencement date	15.04.2024
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days)	915
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	17.10.2026
Timp utilizat (%) Time used (%)	27.87% (255 days)
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	38 746 632.26 EUR
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	18 610 011.48
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	48.03%
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	29.24%
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul și Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	14.05.2024

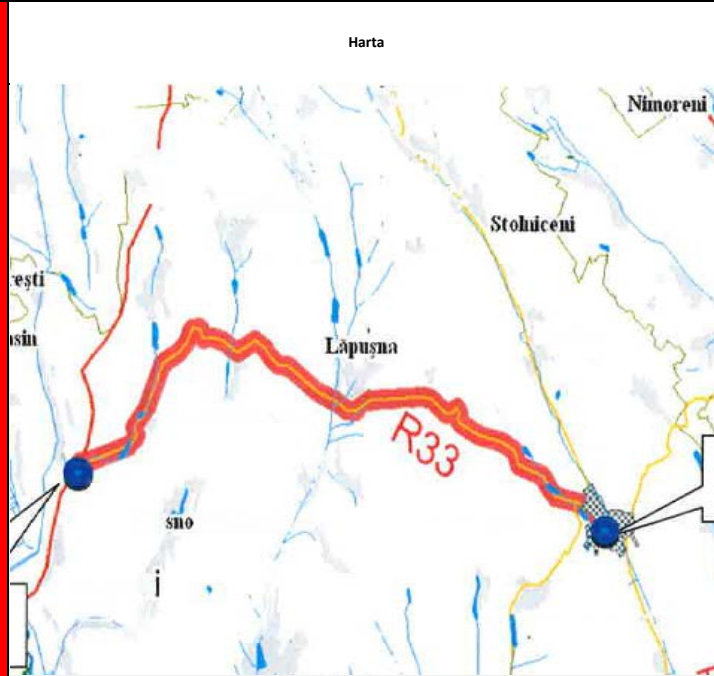

Lucrari majore raportate în ultima săptămână

Nu s-au efectuat lucrari in perioada raportata

Programme of Works No.1

	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25
Planned Progress	1%	5%	10%	20%	25%	26%	30%	35%	42%	45%	48%
Actual Progress	0.00%	0.00%	0.60%	1.84%	5.51%	11.82%	22.56%	28.09%	29.24%	29.24%	29.62%
Monthly Progress	0.00%	0.00%	0.60%	1.24%	3.80%	6.31%	10.74%	5.49%	1.96%	0.00%	0.02%
Time Elapsed	2%	5%	8%	12%	15%	18%	22%	25%	28%	31%	34%

