


Contractul de lucrări Nr. RSP/W15/05: Rehabilitation of Independentei street in Singerei, phase II.

Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender	13.05.2024	
Finanțare Funding	European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094	
Lungimea sectorului de drum (km)	6.47	
Antreprenor Contractor	"Nouconst & Corsag" Joint Venture(Moldova)	
Inginer (Compania de Supervizare) Engineer	IRD Engineering S.R.L. (Italy)	
Data semnării contractului Date of signing the contract	04.12.2024	
Înștiințarea de începere a lucrărilor	31.01.2025	
Durata de execuție a lucrărilor (zile) Period of the works (days)	183	
Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)	0	
Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works	02.08.2025	
Țimp utilizat (luni) Time used (%)	57.38%	Lucrari majore raportate în ultima săptămână: 1) lucrari de terasamente; 2) Demontarea bordurelor; 3) montarea bordurilor mici; 4) montarea bordurilor mari; 5) amenajarea pavajului la triotuire și piste pentru bicicliști.
Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)	2 691 781.21 EUR	
Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)	0.00 EUR	
Progresul financiar (%) Financial progress (%)	0.00%	
Progresul fizic (%) Physical progress (%)	7.84%	
Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer	17.01.2025	

Programme of Works No. 01

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Planned Progress	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Actual Progress	0.00%	0.00%	7.84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Monthly Progress	0.00%	0.00%	7.84%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Time Elapsed	0%	15%	32%	49%	66%	82%	99%	116%	132%	149%	166%	183%

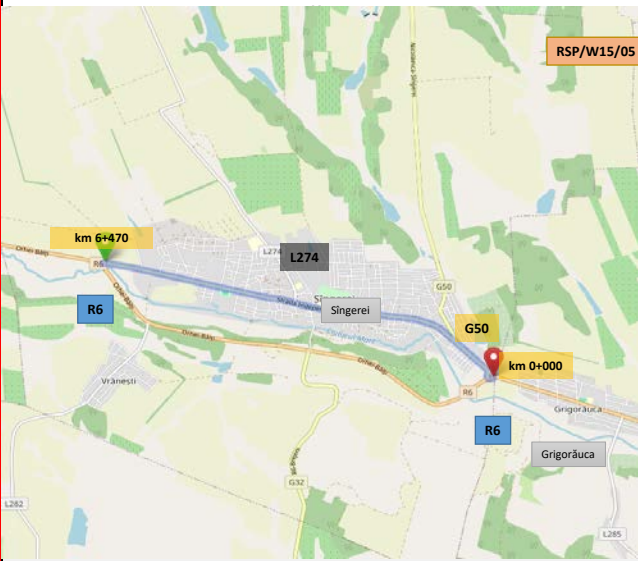
