


|                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.05.2025                                                                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Contractul de lucrări Nr. RSP/W14/02: Rehabilitation R14 R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – Ukraine border, section km 92+620 – km 123+620. |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Invitație pentru depunerea ofertelor (data) Invitation to tender (date)                                                                      | 22.12.2022                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Finanțare Funding                                                                                                                            | European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), EBRD Project ID: 45094 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lungimea sectorului de drum (km) The length of the road sector (km)                                                                          | 31.00                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Antreprenor Contractor                                                                                                                       | ONUR Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret ve Sanayi S.R.L. (Turkey)               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inginer (Compania de Supraveghere) Engineer                                                                                                  | IRD Engineering S.R.L. (Italy)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data semnării contractului Date of signing the contract                                                                                      | 11.07.2023                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Înștiințarea de începere a lucrărilor                                                                                                        | 01.12.2023                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durata de execuție a lucrărilor (zile)                                                                                                       | 915                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Extensie de timp acordată (zile) Extension of time (days)                                                                                    | 0                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Termenul de finalizare al lucrărilor The deadline for the completion of the works                                                            | 03.06.2026                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Timp utilizat (luni) Time used (%)                                                                                                           | 58.14%                                                                          | <p><b>Lucrari majore raportate în ultima săptămână:</b></p> <p>1) lucrări de excavarare - km 98,00 - 98,50; km 102,08 - 102,50;<br/>2) îmbunătățirea terasamentului - km 102,08 - 102,50;<br/>3) nivelarea taluzului și a platformei drumului - km 93,71-94,1; km 102,80-102,50;<br/>4) frezarea îmbrăcămintel din asfalt - km 98,00-98,50;<br/>5) consolidarea rigolelor cu beton de ciment - km 93,80-94,00; 99,79-99,85; 102,78-103,03;<br/>6) lucrări de consolidare - km 93,564; km 93+700; 94+290;<br/>7) amenajarea stratului de balast - km 102,08 - 102,50;<br/>8) amenajarea stratului de fundatie din piatră spartă - km 102,08 - 102,50.</p> |
| Valoarea de Contract Acceptată (euro) Accepted Contract Value (EUR)                                                                          | 34 639 831.46 EUR                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valoarea achitată până în prezent (EUR) Amount paid to date (EUR)                                                                            | 14 617 081.83 EUR                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Progresul financiar (%) Financial progress (%)                                                                                               | 42.20%                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Progresul fizic (%) Physical progress (%)                                                                                                    | 21.19%                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Data ultimei sedinte cu Antreprenorul si Inginerul The date of the last meeting with the Contractor and the Engineer                         | 06.03.2025                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Programme of Works No. 01

|                  | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25 | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Planned Progress | 38%    | 39%    | 41%    | 46%    | 52%    | 57%    | 63%    | 73%    | 82%    | 90%    | 91%    | 92%    |
| Actual Progress  | 20.53% | 20.66% | 21.19% | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
| Monthly Progress | 0.00%  | 0.13%  | 0.53%  | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     | 0%     |
| Time Elapsed     | 47%    | 50%    | 53%    | 56%    | 60%    | 63%    | 66%    | 70%    | 73%    | 77%    | 80%    | 83%    |

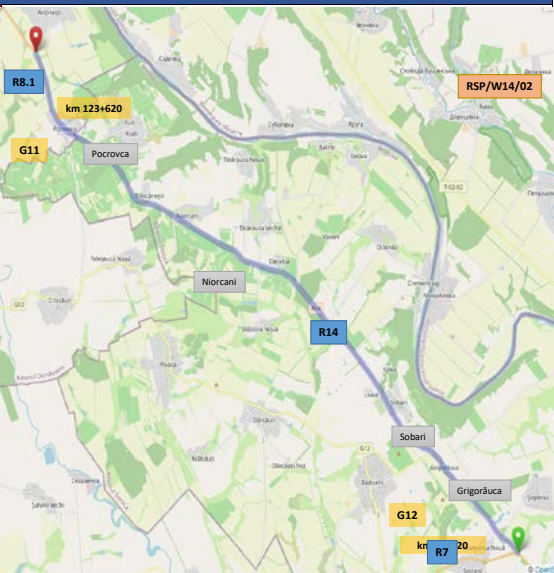
